[BÀI TẬP TỔNG HỢP] Xây dựng Kế hoạch Sprint tích hợp cho CampusFood

5.1. Chuẩn hóa ước lượng

Mã PBI	PBI	Phiếu / SP	Phân loại	Căn cứ
CF03	Chọn điểm nhận	3 / 5 / 5 / 8	Cần thảo luận lại	3 SP coi đây là dropdown chọn 1 trong 2 căn tin; phiếu 8 SP giả định phải xử lý thêm logic vị trí ngoài trường.
CF04	Nhận đơn/cập nhật giao	5 / 8 / 8 / 13	Cần thảo luận lại	Lệch từ 5 đến 13 SP do khác biệt suy nghĩ về luồng cập nhật trạng thái đơn hàng.
CF06	Thanh toán QR	5 / 8 / 13 / 13	Thiếu dữ liệu	Hai phiếu 13 SP từ Phúc - Tích hợp & Minh - Backend, lo ngại rủi ro nghẽn network, xử lý bất đồng bộ.
CF08	Hoàn tiền quán hủy	13 (tạm chốt)	Thiếu dữ liệu	Chưa có quy tắc tài chính, hoàn tiền tự động hay thủ công. Không thể đưa vào Sprint khi chưa sẵn sàng (DoR).

- CF03 Chọn điểm nhận - Phiếu 3/5/5/8:
    - Làm rõ: Người giơ 3 SP chỉ nghĩ đến chọn 2 căn tin cố định. Người giơ 8 SP lo lắng việc validate địa chỉ ngoài trường.

    - Đề xuất kết quả: Thống nhất khoanh vùng phạm vi MVP: Chỉ cho phép chọn 2 Căn tin trong trường. Khi thống nhất scope này, người giơ 8 SP rút về 5 SP.
- CF04 Nhận đơn/cập nhật giao - Phiếu 5/8/8/13:
    - Làm rõ: Tích hợp 2 góc độ: Quản lý căn tin chấp nhận đơn + Người giao cập nhật tiến độ.
    - Đề xuất tách thành 2 PBI con:
        1. CF04a: Căn tin nhận đơn & xác nhận chuẩn bị xong → Thống nhất 5 SP.
        2. CF04b: Người giao nhận đơn & cập nhật trạng thái giao/đã giao → Thống nhất 3 SP.
- CF06 (Thanh toán QR - Phiếu 5/8/13/13):
    - Làm rõ: Phiếu 5 SP giả định cổng QR hoạt động hoàn hảo. Phiếu 13 SP do lo sợ thiếu SLA và xử lý lỗi callback.
    - Đề xuất Refine: Thực hiện 1 Technical Spike (nghiên cứu/mock API cổng QR) trước hoặc ngay đầu Sprint, thống nhất chốt ở mức độ phức tạp trung bình-cao.
- CF08 (Hoàn tiền quán hủy):
    - Đề xuất: Trả lại Product Backlog. Yêu cầu PO làm rõ Acceptance Criteria trước khi cho Planning Poker lại ở Sprint sau.

5.2. Sprint Goal và phạm vi :

Sprint Goal: "Giúp sinh viên hoàn tất luồng mua đồ ăn từ Xem thực đơn, Đặt món, Chọn điểm nhận tại 2 căn tin, Thanh toán QR an toàn đến Cập nhật trạng thái nhận/giao để đưa vào dùng thử thực tế thành công."

Mã PBI	Tên PBI	Ưu tiên	SP	Phụ thuộc / Sẵn sàng	Quyết định	Lý do & Căn cứ lựa chọn / Loại trừ
CF01	Xem thực đơn/còn món	1	3	Sẵn sàng	CHỌN	Đầu luồng trải nghiệm, Baseline (3 SP).
CF02	Tạo đơn/mã xác nhận	2	5	Phụ thuộc CF01	CHỌN	Luồng nghiệp vụ cốt lõi.

CF03	Chọn điểm nhận	3	5	Đã thu hẹp scope	CHỌN	Cần thiết để xác định nơi nhận/giao tại 2 căn tin.
CF04a	Căn tin nhận đơn	4a	5	Phụ thuộc CF02, CF03	CHỌN	Khâu xử lý đơn phía căn tin (Tách từ CF04).
CF04b	Cập nhật trạng thái giao	4b	3	Phụ thuộc CF04a	CHỌN	Hoàn tất khâu vận chuyển (Tách từ CF04).
CF05	Xem trạng thái giao	5	5	Phụ thuộc CF04	CHỌN	Phản hồi thông tin cho người mua.
CF06	Thanh toán QR	6	8	Đã giải tỏa bằng Mock/Spike	CHỌN	Mắt xích quan trọng để hoàn thành luồng dùng thử E2E.
CF07	Biên nhận điện tử	7	3	Phụ thuộc CF06	LOẠI	Tính năng phụ trợ; loại bỏ để đảm bảo vừa Capacity và kiểm soát rủi ro.
CF08	Hoàn tiền quán hủy	8	13	Thiếu AC	LOẠI	Chưa sẵn sàng, rủi ro cao.
CF09	Đánh giá người giao	9	3	Ưu tiên thấp	LOẠI	Không bắt buộc cho luồng dùng thử MVP.

5.3. Task Breakdown và Capacity

Lan (Frontend): $(10ngày \times 6h/ngày) - 6h\ (Hỗtrợ) = 54giờ$
Minh (Backend): $(8ngày \times 6h/ngày) - 0h = 48giờ$
Ngọc (QA/BA): $(10ngày \times 5h/ngày) - 5h(Họp) = 45giờ$
Phúc (Tích hợp): $(9ngày \times 6h/ngày) - 8h\ (Tíchhợpcũ) = 46giờ$
Tổng Capacity toàn đội ban đầu: $54 + 48 + 45 + 46 = 193giờ$.

Minh nghỉ thêm 2 ngày: Trừ $2ngày \times 6h/ngày = 12giờ$.
Capacity mới của Minh: $48 - 12 = 36giờ$.
Tổng Capacity mới toàn đội: $193 - 12 = 181giờ$.

Tác động : Phúc chia sẻ viết một số API backend cơ bản và Lan sử dụng Mock Data sớm để phát triển UI độc lập, giảm thời gian chờ API.

PBI 1: CF02 - Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

1. Task 1 (Minh): Thiết kế database schema cho đơn hàng và viết API POST /orders tạo đơn kèm sinh mã xác nhận OTP/QR.
    - Đầu ra: API endpoint và Tài liệu Swagger API Spec.
    - Phụ thuộc: Không.
2. Task 2 (Lan - Phối hợp Minh): Dựng giao diện màn hình Xác nhận đơn hàng và kết nối API tạo đơn.
    - Đầu ra: Màn hình Frontend tạo đơn hoạt động trên môi trường Staging.
    - Phụ thuộc: Task 1.
3. Task 3 (Ngọc): Soạn kịch bản kiểm thử cho các kịch bản tạo đơn thành công, lỗi hết món, trùng mã.
    - Đầu ra: Tài liệu kịch bản kiểm thử.
    - Phụ thuộc: Acceptance Criteria của CF02.
4. Task 4 (Ngọc - Phối hợp Lan, Minh): Thực hiện kiểm thử E2E luồng tạo đơn, phát hiện và xác nhận fix bug.
    - Đầu ra: Biên bản Pass Test Case, không còn bug severity High/Critical.
    - Phụ thuộc: Task 1, Task 2, Task 3.

PBI 2: CF06 - Thanh toán QR (8 SP)


1. Task 1 (Phúc): Nghiên cứu SDK/API Cổng thanh toán, dựng Webhook listener để nhận kết quả phản hồi giao dịch.
    - Đầu ra: Module Payment Service xử lý Webhook.
    - Phụ thuộc: Tài liệu API từ bên thứ 3 / SDK Mock.
2. Task 2 (Minh - Phối hợp Phúc): Cập nhật logic chuyển trạng thái đơn hàng trong DB khi nhận tín hiệu thanh toán thành công.
    - Đầu ra: Logic đổi trạng thái đơn Chờ thanh toán → Đã thanh toán.
    - Phụ thuộc: Task 1.

3. Task 3 (Lan): Dựng UI hiển thị mã QR thanh toán, bộ đếm ngược thời gian hết hạn mã và màn hình kết quả.
    - Đầu ra: Giao diện thanh toán QR responsive trên di động.
    - Phụ thuộc: Task 1.
4. Task 4 (Ngọc - Phối hợp Phúc, Minh): Kiểm thử các kịch bản thanh toán: Đúng số tiền, Sai số tiền, Hết hạn, Mất mạng giữa chừng.
    - Đầu ra: Báo cáo kết quả test tích hợp luồng QR.
    - Phụ thuộc: Task 1, 2, 3.

PBI 3: CF03 - Chọn điểm nhận (5 SP)

1. Task 1 (Minh): Xây dựng API GET /locations trả về danh sách 2 căn tin khả dụng và vị trí khung giờ nhận.
    - Đầu ra: API trả về danh sách 2 căn tin cố định.
    - Phụ thuộc: Không.
2. Task 2 (Lan): Dựng Component UI cho phép chọn Căn tin 1 hoặc Căn tin 2 và lưu vị trí vào context đơn hàng.
    - Đầu ra: Component chọn địa điểm tích hợp vào luồng Checkout.
    - Phụ thuộc: Task 1.
3. Task 3 (Ngọc): Kiểm thử ràng buộc địa điểm: Bắt buộc chọn 1 trong 2 căn tin mới cho chuyển bước tiếp theo.
    - Đầu ra: Kết quả test UI/UX chọn điểm nhận đạt yêu cầu.
    - Phụ thuộc: Task 2.

5.5. Burndown và thích nghi

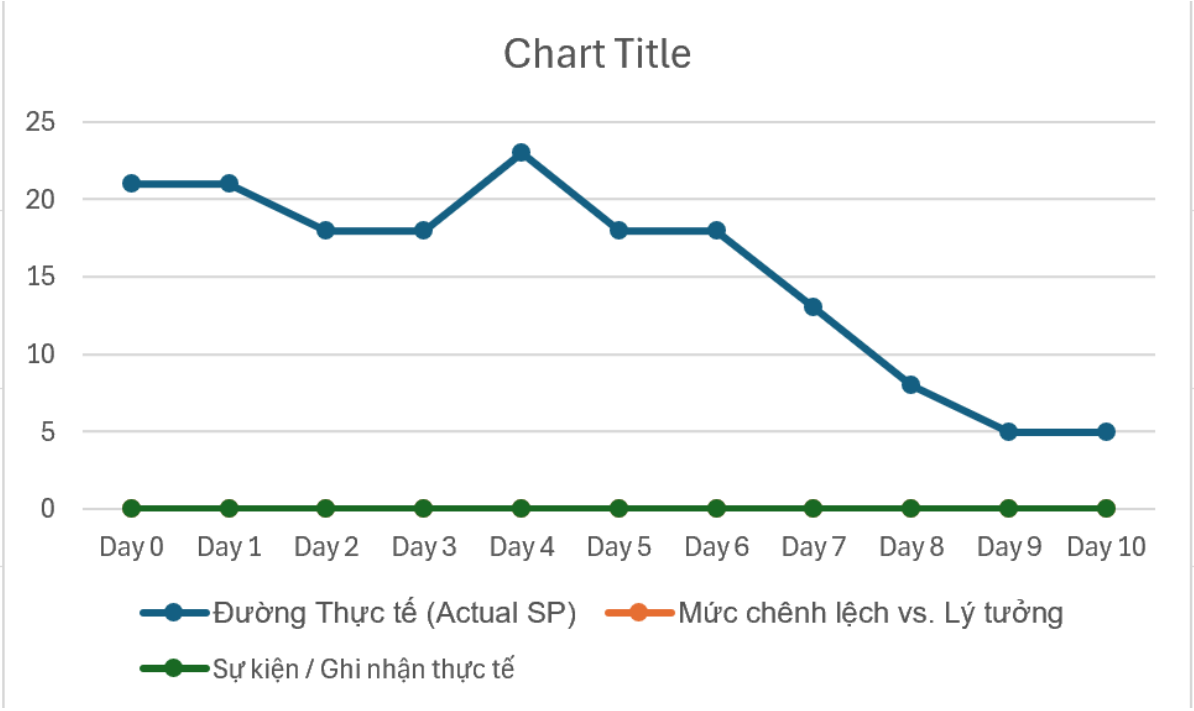

Đề xuất :

- Khi phát hiện Ngày 4 tăng SP, Scrum Master kích hoạt ngay họp khẩn cấp giữa PO và Dev Team để thống nhất cắt giảm PBI tương ứng hoặc từ chối PBI mới nhằm bảo vệ Sprint Goal.
- Không ghi nhận vào Velocity Sprint 1. Trả PBI này về Product Backlog để PO tái đánh giá ưu tiên cho Sprint tiếp theo.
- Đưa việc "Họp ngày 6 không ghi nhận quyết định" thành Action Item: Mọi buổi họp từ Sprint sau bắt buộc phải có buổi họp và phân công người chịu trách nhiệm hành động trong 24h.

5.6. Ngoại lệ và thay đổi

Sự cố 1: Lỗi cổng QR sau khi tạo đơn hàng

- Phương án xử lý: Triển khai cơ chế Fallback nghiệp vụ. Nếu gọi API QR thất bại hoặc timeout sau 30 giây, hệ thống tự động chuyển đơn hàng sang trạng thái "Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận tại Căn tin". Đơn hàng giữ nguyên, không bị trôi luồng.

Sự cố 2: Khách chọn địa điểm ngoài trường / Thiếu SĐT

- Phương án xử lý: Xử lý Validation ngay tại giao diện Client (Frontend). Chặn bấm "Đặt hàng" và hiển thị thông báo rõ ràng: "CampusFood hiện chỉ hỗ trợ phục vụ tại 2 Căn tin trong trường. Vui lòng cập nhật số điện thoại và địa điểm hợp lệ".

Sự cố 3: Ngày 4 PO đề xuất thêm Mã khuyến mãi (5 SP)

- Phương án xử lý: Áp dụng nguyên tắc Trade-off (Đổi - Trả scope). Nếu PO muốn đưa 5 SP này vào bắt buộc, PO phải rút ra một hoặc nhiều PBI có tổng độ phức tạp tương đương (5 SP) mà không làm ảnh hưởng đến Sprint Goal (ví dụ: rút CF07 và CF09). Nếu làm vỡ Sprint Goal → Từ chối chèn, đưa vào Backlog Sprint sau.

Sự cố 4: PBI mới đạt 80% code, chưa qua kiểm thử (QA)

- Phương án xử lý: Tuyên bố Undone (Chưa hoàn thành). Tuân thủ triệt để Definition of Done. Không chấp nhận nghiệm thu một nửa. PBI được giữ nguyên trạng thái, không gạch điểm Burndown.

Tình huống Ngoại lệ	Tác động đến Sprint Goal	Tác động đến DoD	Tác động đến Velocity & Burndown	Cách thức công khai & Báo cáo tại Review
QR bị lỗi	Rủi ro không đạt tiêu chí "Thanh toán an toàn".	Bắt buộc bổ sung kịch bản Fallback vào Acceptance Criteria.	Khiến Burndown đi ngang ở Ngày 5-6.	Trình diễn (Demo) trực tiếp kịch bản Fallback lỗi QR cho Stakeholders tại Sprint Review để chứng minh tính an toàn.
PO thêm 5 SP	Nguy cơ quá tải gây vỡ Goal nếu không đổi scope.	Không hạ thấp tiêu chuẩn DoD để làm nhanh.	Burndown nhảy vọt ở Ngày 4 ($18 \rightarrow 23SP$).	Công khai nhật ký thay đổi phạm vi tại Sprint Review; giải thích rõ lý do đổi.
PBI đạt 80%	Ảnh hưởng nhẹ đến trải nghiệm hoàn chỉnh.	Kiên quyết giữ vững DoD (Chưa QA = Chưa Done).	Không cộng SP vào Velocity; Burndown còn dư 5 SP ở Ngày 10.	Báo cáo minh bạch trong mục "Unfinished Work" tại Sprint Review; trả PBI về Backlog để PO xếp lịch Sprint sau.
